Planning Plashoeve

Duur van planning % compleet
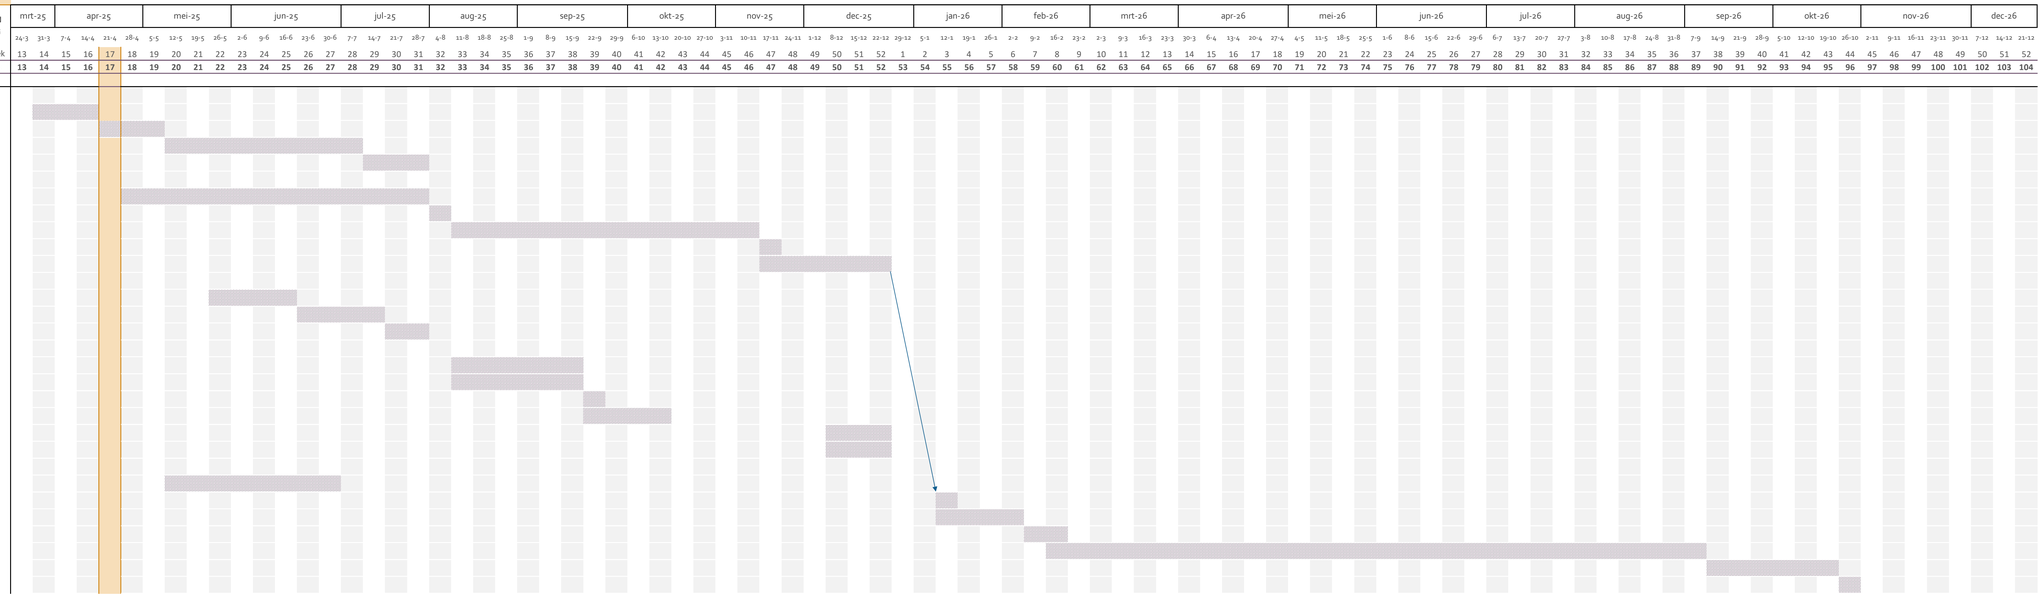
ACTIVITEIT	BEGIN VAN PLANNING	DUUR VAN PLANNING
Markering van periode:		17
	Weeknummer	Projectweek
	BEGIN	DUUR
Ontwerp		
Programma van Eisen	14	3
SO	17	3
VO+	20	9
DO	29	3
Omgevingsvergunning		
Ruimtelijke onderzoeken	18	14
Omgevingsvergunning indienen	32	1
Beoordelen omgevingsvergunning	33	14
Verlening omgevingsvergunning	47	1
Omgevingsvergunning Onherroepelijk	47	6
Prijs & Contractvorming Aannemer		
VO-begroting	22	4
Concept Aanneemovk	26	4
Definitief Aanneemovk.	30	2
Bouwvoorbereiding		
Uitvoeringsgereed Ontwerp	33	6
Sloopmelding	33	6
Slopen	39	1
Bouwaansluiting aanvraag	39	4
Bouwrijp maken	50	3
Kadeherstel?	50	3
Uitvoering		
Aansluitingen	20	8
Start bouw: inrichting bouwterrein	55	1
Funderingswerkzaamheden	55	4
Verplaatsing	59	2
Restauratie, transformatie, nieuwbouw	60	30
Inbouw	90	6
Oplevering	96	1
